HOME STAGING 3D · ÉTAGE SOUS RAMPANT


Cloison Chambre 2 / Chambre 3

Cloison neuve entre la Chambre 2 et la Chambre 3, sous rampant 1,60 m (fenêtres) → 2,70 m (dégagement), cotes relevées sur place. Système : cloison 72/48 sur ossature métallique — 1 plaque BA13 par face, laine de verre 45 mm en âme.

8,60 m²	17,2 m²	165 €
surface par face (trapèze plein)	parement BA13 (2 faces)	matériaux · LM Roques


PLAN Situation dans l'étage

Vue de dessus · la cloison (en rouge) part de la façade des fenêtres et s'arrête sur le mur du dégagement.

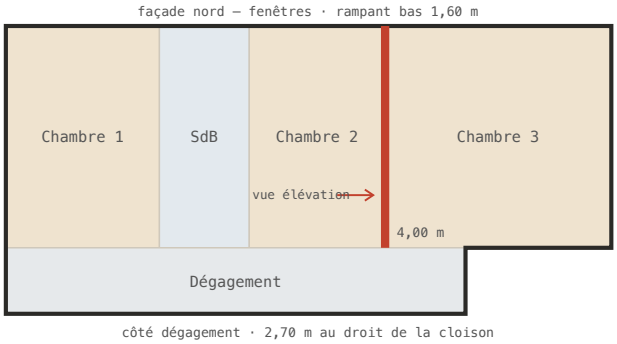

ÉLÉVATION Calepinage d'une face (vue depuis la Chambre 2)

Longueur 4,00 m · hauteur 1,60 m côté fenêtres → 2,70 m côté dégagement · pleine (sans ouverture) · bandes de 1,20 m en demi-plaques 1,20 × 1,25 (plaques coupées en deux pour passer l'escalier)

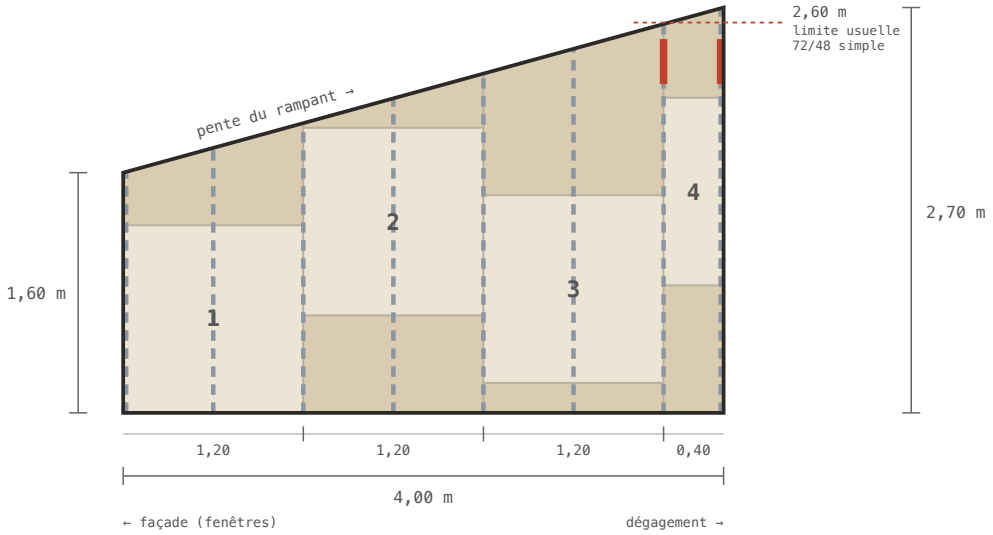

- Demi-plaque entière 1,20 × 1,25 (bandes 1 à 4)
- Pièce recoupée (pied, tête)
- Montants 48/35 (entraxe 60 cm, 40 cm en tête)
- Recouvrement de raboutage (~30 cm)

DEVIS Matériaux à acheter

Leroy Merlin Roques-sur-Garonne (31120) · prix et stock relevés sur leroymerlin.fr le 17/10/2026 — tout est en stock en magasin (retrait 2 h). Prix susceptibles d'évoluer.

PRODUIT · RÉF.	BESOIN	QTÉ	PU	TOTAL
Plaque BA13 standard NORGIPS NF 250 × 120 · *70505960*	17,2 m² · 13 demi-plaques → 7 plaques	7	6,90 €	48,30 €
Lot de 10 montants 48/35 · 2,49 m NF SEMIN · *85343285*	8 montants · rallonges dans les chutes	1 lot	18,90 €	18,90 €
Lot de 10 rails 48 · 3 m NF SEMIN · *85343284*	rail bas 4,00 + rail haut 4,15 → 3 longueurs	1 lot	18,90 €	18,90 €
Laine de verre URSA Serenity 38 kraft 45 mm · botte 16 panneaux 1,35 × 0,60 (12,96 m²) · *69899585*	≈ 8,6 m² + chutes	1 botte	40,05 €	40,05 €
Vis tête ronde 3,5 × 9,5 STANDERS · boîte de 200 · *67835824*	≈ 40 (montants sur rails, raboutages)	1	5,99 €	5,99 €
Enduit joint en pâte AXTON 7 kg · *83972745*	≈ 12 à 14 kg (2 passes, 2 faces, joints horizontaux en plus)	1	12,90 €	12,90 €
Enduit joint en pâte AXTON 4 kg · *83972744*		2	9,99 €	19,98 €
Total TTC				**165,02 €**

À noter

- Non repris dans ce devis : vis plaque 25 mm (≈ 175), bande à joint (≈ 44 m, joints horizontaux compris), bande résiliente (≈ 12,5 m), chevilles du rail bas (≈ 8).
- Pour éviter les raboutages de M7 et M8 : 2 montants 48/35 de 3 m SEMIN (*67532115*, 2,90 € pièce, soit +5,80 €).
- Variante enduit : sac de poudre CE78 SEMIN 25 kg (*69926262*, 22,50 €), moins cher au kilo mais à gâcher.

⚠️ **À vérifier avant d'acheter : la hauteur.** Une cloison 72/48 en montants simples à 60 cm est généralement limitée à environ 2,60 m. Ici, seuls les ~36 derniers centimètres côté dégagement dépassent 2,60 m (jusqu'à 2,70 m), et ils tombent dans la **dernière travée, entre M7 (3,60 m) et M8 (4,00 m), qui n'a que 40 cm d'entraxe** : le montant de renfort M7b du calepinage précédent n'est plus nécessaire. Contrôle tout de même le tableau des hauteurs limites du fabricant (Placo, Knauf) ou demande au vendeur. Alternative : ossature de 70 mm (rails et montants de 70, laine 60–70 mm, cloison finie ≈ 95 mm).

PLAQUES Calepinage en demi-plaques

Plaques coupées en deux à 1,25 m au pied de l'escalier, autres coupes faites en haut. Joints horizontaux décalés d'au moins 40 cm d'une bande à l'autre.

BANDE	POSE (DE BAS EN HAUT)
1 · 0–1,20	H. 1,60 → 1,93 : Demi-plaque (0 → 1,25) + tête en biais 0,35 → 0,68. Joint à 1,25.
2 · 1,20–2,40	H. 1,93 → 2,26 : Pied 0,65 + demi-plaque (→ 1,90) + tête en biais 0,03 → 0,36. Joints à 0,65 et 1,90.
3 · 2,40–3,60	H. 2,26 → 2,59 : Pied 0,20 + demi-plaque (→ 1,45) + tête en biais 0,81 → 1,14. Joints à 0,20 et 1,45.
4 · 3,60–4,00	H. 2,59 → 2,70 : Bandes de 0,40 : pied 0,85 + 1,25 (→ 2,10) + tête 0,49 → 0,60. Joints à 0,85 et 2,10.
Débit 2 faces	6 entières · 2 → têtes 3 + 2 · 2 → pieds 0,65 + 0,20 · 1 → 2 têtes de bande 1 · 2 refendues en 3 × 0,40 (bande 4 : 2 pièces de 1,25, 2 pieds, 2 têtes).

Soit 13 demi-plaques = 7 plaques : la 14e demi-plaque sert de marge. L'autre face (côté Chambre 3) suit le même calepinage en miroir.

MONTANTS Débit des montants 2,49 m


Entraxe 60 cm (40 cm en tête de cloison) · couper ~1 cm plus court et en biais en tête pour suivre le rail haut.

N°	POS.	HAUT.	DÉBIT
M1	0,00	1,60	1 montant (départ, contre façade) · chute 0,89
M2	0,60	1,77	1 montant · chute 0,72
M3	1,20	1,93	1 montant · chute 0,56
M4	1,80	2,10	1 montant
M5	2,40	2,26	1 montant
M6	3,00	2,43	1 montant
M7	3,60	2,59	1 montant + rallonge 0,40 (chute M3)
M8	4,00	2,70	1 montant (contre dégagement) + rallonge 0,51 (chute M2)

Rallonge = hauteur – 2,49 + 0,30 de recouvrement. Total : 8 montants sur un lot de 10.

COUPE Coupe type (vue de dessus)

Cloison 72/48 — épaisseur finie ≈ 73 mm · schéma non à l'échelle en largeur



Montants 48/35 tous les 60 cm · laine de verre 45 mm entre montants · épaisseur totale 12,5 + 48 + 12,5 ≈ 73 mm.

MISE EN ŒUVRE Points d'attention

- **Mesurer sur place avant toute découpe** : les cotes 1,60 m et 2,70 m sont celles relevées aux deux extrémités ; vérifie la hauteur au droit de chaque montant avant de le couper.
- **Rail haut sous le rampant** : suit la pente (4,15 m développés), vissé tous les 60 cm dans la charpente ou les fourrures, pas seulement dans la plaque (vis bois ≈ 4 × 40, non chiffrées).
- **Rails de 3 m** : rail bas = 3,00 + 1,00 m, rail haut = 3,00 + 1,15 m (chutes dans une 3e longueur).
- **Raboutage des montants** (M7, M8) : emboîter deux montants l'un dans l'autre sur ~30 cm, puis visser (TRPF) ou riveter — recouvrement à confirmer selon la notice du fabricant.
- **Joints** : les joints verticaux tombent sur les montants (bandes de 1,20 m). Les joints horizontaux sont entre deux bords coupés : chanfreine-les au rabot à placo, puis bande + enduit comme les autres.

HOME STAGING 3D · DEUXIÈME MUR

Mur 2 · 1,55 m × 3,00 → 3,46 m


Mur en trapèze : montant gauche 3,00 m, montant droit 3,46 m, largeur 1,55 m. Pas d'isolant, mais il ne doit pas sonner creux. Système : cloison 98/48 — même ossature de 48 que le mur 1, **montants tous les 40 cm**, **2 plaques BA13 par face**, sans laine. La double peau double la masse de plâtre (25 mm par face) : c'est elle qui supprime l'effet « creux », pas la laine.

5,01 m²
surface par face (trapèze plein)

20,0 m²
parement BA13 (2 faces × 2 peaux)

106 €
matériaux · LM Roques

ÉLÉVATION Ossature et joints

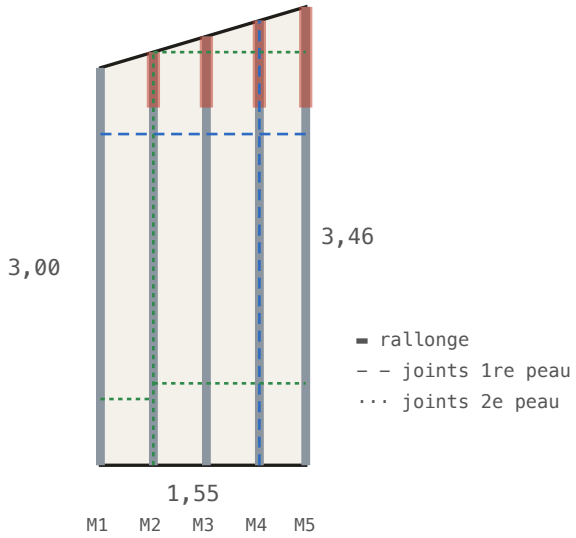

Montants à 0 / 0,40 / 0,80 / 1,20 / 1,55 m. Les joints verticaux tombent sur M4 (1re peau) et sur M2 (2e peau) : décalés de 80 cm.

MONTANTS Débit des montants 48/35 · 3 m

Entraxe 40 cm (35 cm au bout) · couper ~1 cm plus court et en biais en tête pour suivre le rail haut.

N°	POS.	HAUT.	DÉBIT
M1	0,00	3,00	1 montant (côté gauche)
M2	0,40	3,12	1 montant + rallonge 0,42
M3	0,80	3,24	1 montant + rallonge 0,54
M4	1,20	3,36	1 montant + rallonge 0,66
M5	1,55	3,46	1 montant (côté droit) + rallonge 0,76
—			6e montant : les 4 rallonges (2,38 m) · chute 0,62

Rallonge = hauteur − 3,00 + 0,30 de recouvrement. Total : 6 montants de 3 m. Rails : bas 1,55 m + haut 1,62 m (en pente) → 2 rails 48 pris dans le lot du mur 1 (5 utilisés sur 10).

PLAQUES Débit · 9 plaques

PEAU	POSE (PAR FACE)
1re	Plaque entière 0 → 1,20 + bande de 0,35 · tête en biais au-dessus de 2,50 m.
2e	Bande de 0,40 + bande de 1,15. Recoupe la pièce de tête à l'horizontale et pose le rectangle en pied : joints horizontaux vers 0,50–0,62 m et 3,00–3,12 m, décalés de ceux de la 1re peau.

6 plaques pour les pièces de 2,50 m (2 entières, 2 refendues à 1,15, 1 refendue 0,40 + 0,40 + 0,35, 1 refendue 0,35 dont la chute de 0,85 sert aux têtes des bandes étroites) + 2 plaques pour les têtes larges = 8, + 1 de marge.

DEVIS Mur 2 · matériaux à acheter

Leroy Merlin Roques-sur-Garonne (31120) · relevé sur leroymerlin.fr le 17/10/2026 · en stock : 1 886 montants 48/35 de 3 m, 68 boîtes de vis 35.

PRODUIT · RÉF.	BESOIN	QTÉ	PU	TOTAL
Plaque BA13 standard NORGIPS NF 250 × 120 · *70505960*	20 m² · 8 plaques + 1 de marge	9	6,90 €	62,10 €
Montant métallique 48/35 · 3 m SEMIN · *67532115*	5 montants + 1 pour les rallonges	6	2,90 €	17,40 €
Rails 48 · 3 m · *lot du mur 1 (85343284)*	rail bas 1,55 + rail haut 1,62	2	—	0,00 €
Vis plaque acier STANDERS 3,5 × 35 · boîte de 1000 · *67712456*	2e peau ≈ 300 vis	1	13,50 €	13,50 €
Enduit joint en pâte AXTON 7 kg · *83972745*	≈ 6 kg (joints des 2 peaux)	1	12,90 €	12,90 €
Total TTC mur 2				**105,90 €**

À noter

- Hauteur : en 98/48 double peau, Placo donne 3,55 m avec des montants simples à 40 cm (fiche SP00021565), contre ≈ 3,00–3,10 m à 60 cm, d'où l'entraxe resserré. Vérifie la valeur « sans isolant » sur la fiche avant d'acheter.
- Non repris (comme pour le mur 1) : vis 25 mm pour la 1re peau (≈ 150), bande à joint (≈ 12 m), chevilles du rail bas (≈ 3), fixation du rail haut. Les vis TRPF 9,5 mm du mur 1 suffisent pour les deux murs.
- Pour encore moins de résonance : une bande résiliente sous les rails et contre les murs (non chiffrée).

LISTE DE COURSE Les deux murs · LM Roques

PRODUIT · RÉF.	MUR 1	MUR 2	QTÉ	TOTAL
Plaque BA13 NORGIPS 250 × 120 · *70505960*	7	9	16	110,40 €
Lot de 10 montants 48/35 · 2,49 m · *85343285*	1	—	1	18,90 €
Montant 48/35 · 3 m SEMIN · *67532115*	—	6	6	17,40 €
Lot de 10 rails 48 · 3 m · *85343284*	3 rails	2 rails	1	18,90 €
Laine URSA Serenity 38 · 45 mm · *69899585*	1	—	1	40,05 €
Vis TRPF 3,5 × 9,5 STANDERS · 200 · *67835824*	1	—	1	5,99 €
Vis plaque 3,5 × 35 STANDERS · 1000 · *67712456*	—	1	1	13,50 €
Enduit AXTON 7 kg · *83972745*	1	1	2	25,80 €
Enduit AXTON 4 kg · *83972744*	2	—	2	19,98 €
Total TTC (165,02 € + 105,90 €)				**270,92 €**

LISTE DE COURSE

Comparatif · Point P Auterive

Point P Auterive, ZA Lavigne, 31190 Auterive · 05 34 59 56 49 · lun.–ven. 7h30–12h / 13h30–17h · prix catalogue TTC et stock agence relevés sur pointp.fr le 20/10/2026.

PRODUIT POINT P · RÉF.	STOCK	QTÉ	PU	TOTAL	LM
Plaque BA13 Knauf KS 250 × 120 · *1831598*	274	16	11,12 €	177,92 €	110,40 €
Montant SPP M48 · 3 m · à l'unité · *1830248*	419	14	5,38 €	75,32 €	36,30 €
Rail SPP R48 · 3 m · à l'unité · *1830292*	154	5	4,51 €	22,55 €	18,90 €
Sous-total ossature + plaques				**275,79 €**	**165,60 €**
Laine 45 mm · vis TRPF 9,5 · vis 35 · enduits	—	—	—	non relevé	105,32 €

Verdict

- Tout l'essentiel est **en stock à Auterive** (plaques, montants, rails), mais au prix catalogue c'est **≈ 110 € plus cher** que LM Roques sur ces 3 lignes : la plaque est à 11,12 € contre 6,90 €.
- Montants : Point P les vend à l'unité. 14 montants de 3 m couvrent les deux murs : 8 pour le mur 1 (plus besoin de raboutage) et 6 pour le mur 2. Une version 2,50 m existe (*1830252*), prix non relevé.
- Cage d'escalier : Point P a aussi la BA13 Knauf KS 250 × 60 (*4337409*, 12,50 € pièce, 80 en stock). Elle évite la découpe, mais le mur 1 en demanderait 14 (≈ 175 €).
- Le site a bloqué la consultation (protection anti-robot) avant la laine, les vis et l'enduit : à demander à l'agence par téléphone. Les prix catalogue sont publics : avec un compte pro ou en demandant un devis au comptoir, l'écart peut se réduire.

LISTE DE COURSE

Comparatif · Chausson Auterive

Chausson Matériaux Auterive, 72 route de Toulouse, 31190 Auterive · 05 61 61 08 61 · lun.–ven. 7h30–12h / 13h30–18h · prix et stock agence relevés sur chausson.fr le 20/10/2026.

PRODUIT CHAUSSON · CODE	STOCK	QTÉ	PU	TOTAL	LM
Plaque BA13 Siniat Prégyplac 250 × 120 · *6952-2*	426	16	11,52 €	184,32 €	110,40 €
Montant Gypso 48/35 · 2,50 m · *174894-1*	366	8	3,04 €	24,32 €	18,90 €
Montant Gypso 48/35 · 3,00 m · *174894-5*	308	6	3,64 €	21,84 €	17,40 €
Rail Gypso 48 · 3 m · *174985-1*	497	5	2,77 €	13,85 €	18,90 €
Laine Ultracoustic 45 mm · 19,2 m² · *534294-1*	Castanet	1	57,37 €	57,37 €	40,05 €
Vis TRPF Gypso 3,5 × 9,5 · 500 · *353373-1*	9	1	15,88 €	15,88 €	5,99 €
Vis TTPC Gypso 3,5 × 35 · 1000 · *104714-1*	8	1	14,94 €	14,94 €	13,50 €
Enduit joint pâte Gypso GS · 25 kg · *287236-1*	3	1	34,46 €	34,46 €	45,78 €
Total TTC deux murs				**366,98 €**	**270,92 €**

Verdict

- Chausson Auterive a **tout en stock sauf la laine**, mais revient **≈ 96 € plus cher** que LM Roques. Là encore, c'est la plaque qui fait l'écart : 11,52 € contre 6,90 €.
- Moins cher chez Chausson : les rails (vendus à l'unité, pas de lot de 10) et l'enduit (un seau de 25 kg couvre les ≈ 20 kg des deux murs). Les montants de 2,50 m existent à l'unité, sans recoupe pour le mur 1.
- Laine : l'Ultracoustic est à Castanet (60 en stock), à faire venir. En stock à Auterive : Isover Par Phonic 45 mm (*290731-1*, 69,07 €, 1 colis), mais 7,8 m² seulement pour ≈ 8,6 m² de mur.
- Récap : LM Roques 270,92 € · Chausson 366,98 € · Point P plus cher que LM sur les plaques et l'ossature (275,79 € contre 165,60 €). **LM Roques reste le moins cher.**
